

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kart – Mät – GIS-enheten

Fastighetsbeteckning (ex: Lomma 34:1)	Adress
---------------------------------------	--------

Åtgärd

Uppdraget debiteras enligt gällande PBL-taxa.

- Grovutsättning
- Finutsättning
- Lägeskontroll
- Mätningstjänster
- Övrigt (fyll i under *Kommentar* nedan)

Åtgärden avser

- Huvudbyggnad
- Tillbyggnad, komplementbyggnad
- Övrigt (fyll i under *Kommentar* nedan)

Godkänd stämplad bygglovsritning, måttsatt nybyggnadskarta eller situationsplan bifogas

Kommentar

Beställarens/Företagets namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefon	Datum/Namnteckning
E-postadress	
Faktureringsadress och märkning	

Underlag för fakturering (ifylles av mätningsingenjör)

<input type="checkbox"/> Grovutsättning i höjd och plan upptill maximalt 8 hörn
<input type="checkbox"/> Pristillägg för grovutsättning av hörn utöver de 8 första
<input type="checkbox"/> Finutsättning i höjd och plan upptill maximalt 8 hörn
<input type="checkbox"/> Pristillägg för finutsättning utöver de 8 första
<input type="checkbox"/> Lägeskontroll i höjd och plan upptill maximalt 8 hörn
<input type="checkbox"/> Pristillägg för lägeskontroll utöver de 8 första
<input type="checkbox"/> Övrig mätning
<input type="checkbox"/>

Blanketten skickas till
Lomma Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
234 81 Lomma
KMG@lomma.se

För ytterligare information
Lomma Kommun
Kontaktcenter 040-641 10 00

Observera!
Genom att skicka in blanketten godkänner du att Lomma Kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnar, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204)

BESKRIVNING AV GROV- OCH FINUTSÄTTNING

SAMT LÄGESKONTROLL

Vi utför husutstakningen i två delmoment, grovutsättning och finutsättning. Det är möjligt att göra både grov- och finutsättning vid ett tillfälle.

Grovutsättning brukar göras innan schaktningen och finutsättning före byggnadens formsättning. Det finns inget krav för grovutsättning, men det underlättar inför markarbetet på byggplatsen.

1. Förberedelse

Vid grov- och finutsättning ska tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet.


Det är beställaren som är ansvarig för att det finns virke för de profiler som behövs för finutstakning. Lämpliga dimensioner på virke är minst 45x70 millimeter för stolpar och 22x70 millimeter för brädor.

2. Grovutsättning

Under grovutsättningen markerar vi ut byggnadens hörn med stickor eller genom att spreja på marken. Det sker med några centimeters noggrannhet. Vi sätter också ut en referenshöjd, som ofta är föreslagen sockel- eller golvhöjd bestämd vid det tekniska samrådet.

3. Finutsättning

Vid finutsättningen markerar vi ut husets yttre väggar med hjälp av spikar på profilbrädorna (se bild nedan). Beställaren ansvarar för att profilbrädor samt profilstolpar med god stabilitet är nedslagna innan finutsättningen.

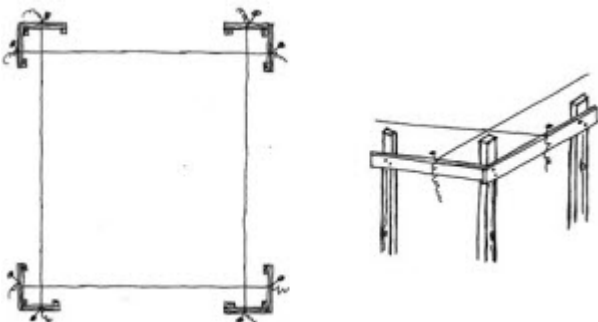

4. Lägeskontroll

När bygglovet kräver en lägeskontroll ska en behörig sakkunnig utföra detta efter att plattan är gjuten och innan inflyttning för att kontrollera att bygglovet har följts.
